Name	Begin date	End date
Pre Load Development	10/21/19	3/3/20
Project Targets	10/21/19	10/29/19
Load Objectives	10/21/19	10/29/19
Bullet Chamber Fit Drawing	10/21/19	10/21/19
Pressure Equipment	10/30/19	3/3/20
Calibration Adapter	10/30/19	3/3/20
Transducer	10/30/19	3/3/20
P/V Barrel	10/30/19	3/3/20
Component Sourcing	10/30/19	12/6/19
Bullet	10/30/19	12/6/19
Primer	10/30/19	12/6/19
Shell - Brass	10/30/19	12/6/19
Test Powder ID and Sourcing	10/30/19	12/10/19
Powder ID	10/30/19	10/31/19
Powder Sample Ordering	11/1/19	12/10/19
Test Firearms	10/30/19	12/6/19
Competitor Samples	11/1/19	11/20/19
Loading Equipment	11/1/19	11/20/19
Production Gaging and Tooling	11/21/19	2/26/20
Design Tooling & Gages	11/21/19	12/10/19
Machine Shop Time	12/11/19	2/26/20
Load Development	3/4/20	4/3/20
Prep Load Development Template	3/4/20	3/4/20
Shell Calibration	3/5/20	3/5/20
Barrel Calibration	3/6/20	3/6/20
Powder Screening	3/9/20	3/11/20
Powder Selection	3/12/20	3/12/20
Initial Hot - Cold Testing	3/13/20	3/16/20
Neck Tension	3/13/20	3/13/20
Load Sensetivities	3/16/20	3/17/20
Shoot Sensetivities	3/18/20	3/18/20
Prep Loads for Function Testing	3/19/20	3/19/20
Function Testing	3/20/20	3/20/20
Competitor Evaluation	3/23/20	3/23/20
Prepare Load Development Report	3/24/20	3/24/20
Present Report for Sign Off	3/25/20	3/25/20
Follow Up Testing	3/26/20	4/3/20
Experimental Run	3/26/20	8/6/20
Material Sourcing	3/26/20	6/17/20
Brass	3/26/20	6/17/20
Bullets	3/26/20	6/17/20
Powder	3/26/20	6/17/20
Primers	3/26/20	6/17/20
EX Run 1	6/18/20	6/18/20
EX Run 2	6/19/20	6/19/20
EX Run 1 Lab Testing	6/19/20	7/8/20
EX Run 2 Lab Testing	7/9/20	7/28/20
EX Run Report	7/29/20	8/6/20
Trial and Pilot	8/7/20	11/30/20
Material Sourcing	8/7/20	10/29/20
Brass	8/7/20	10/29/20
Bullets	8/7/20	10/29/20
Powder	8/7/20	10/29/20
Primers	8/7/20	10/29/20
Trial and Pilot Run	10/30/20	10/30/20
Trial and Pilot Lab Testing	11/2/20	11/19/20
Trial and Pilot Report	11/20/20	11/30/20

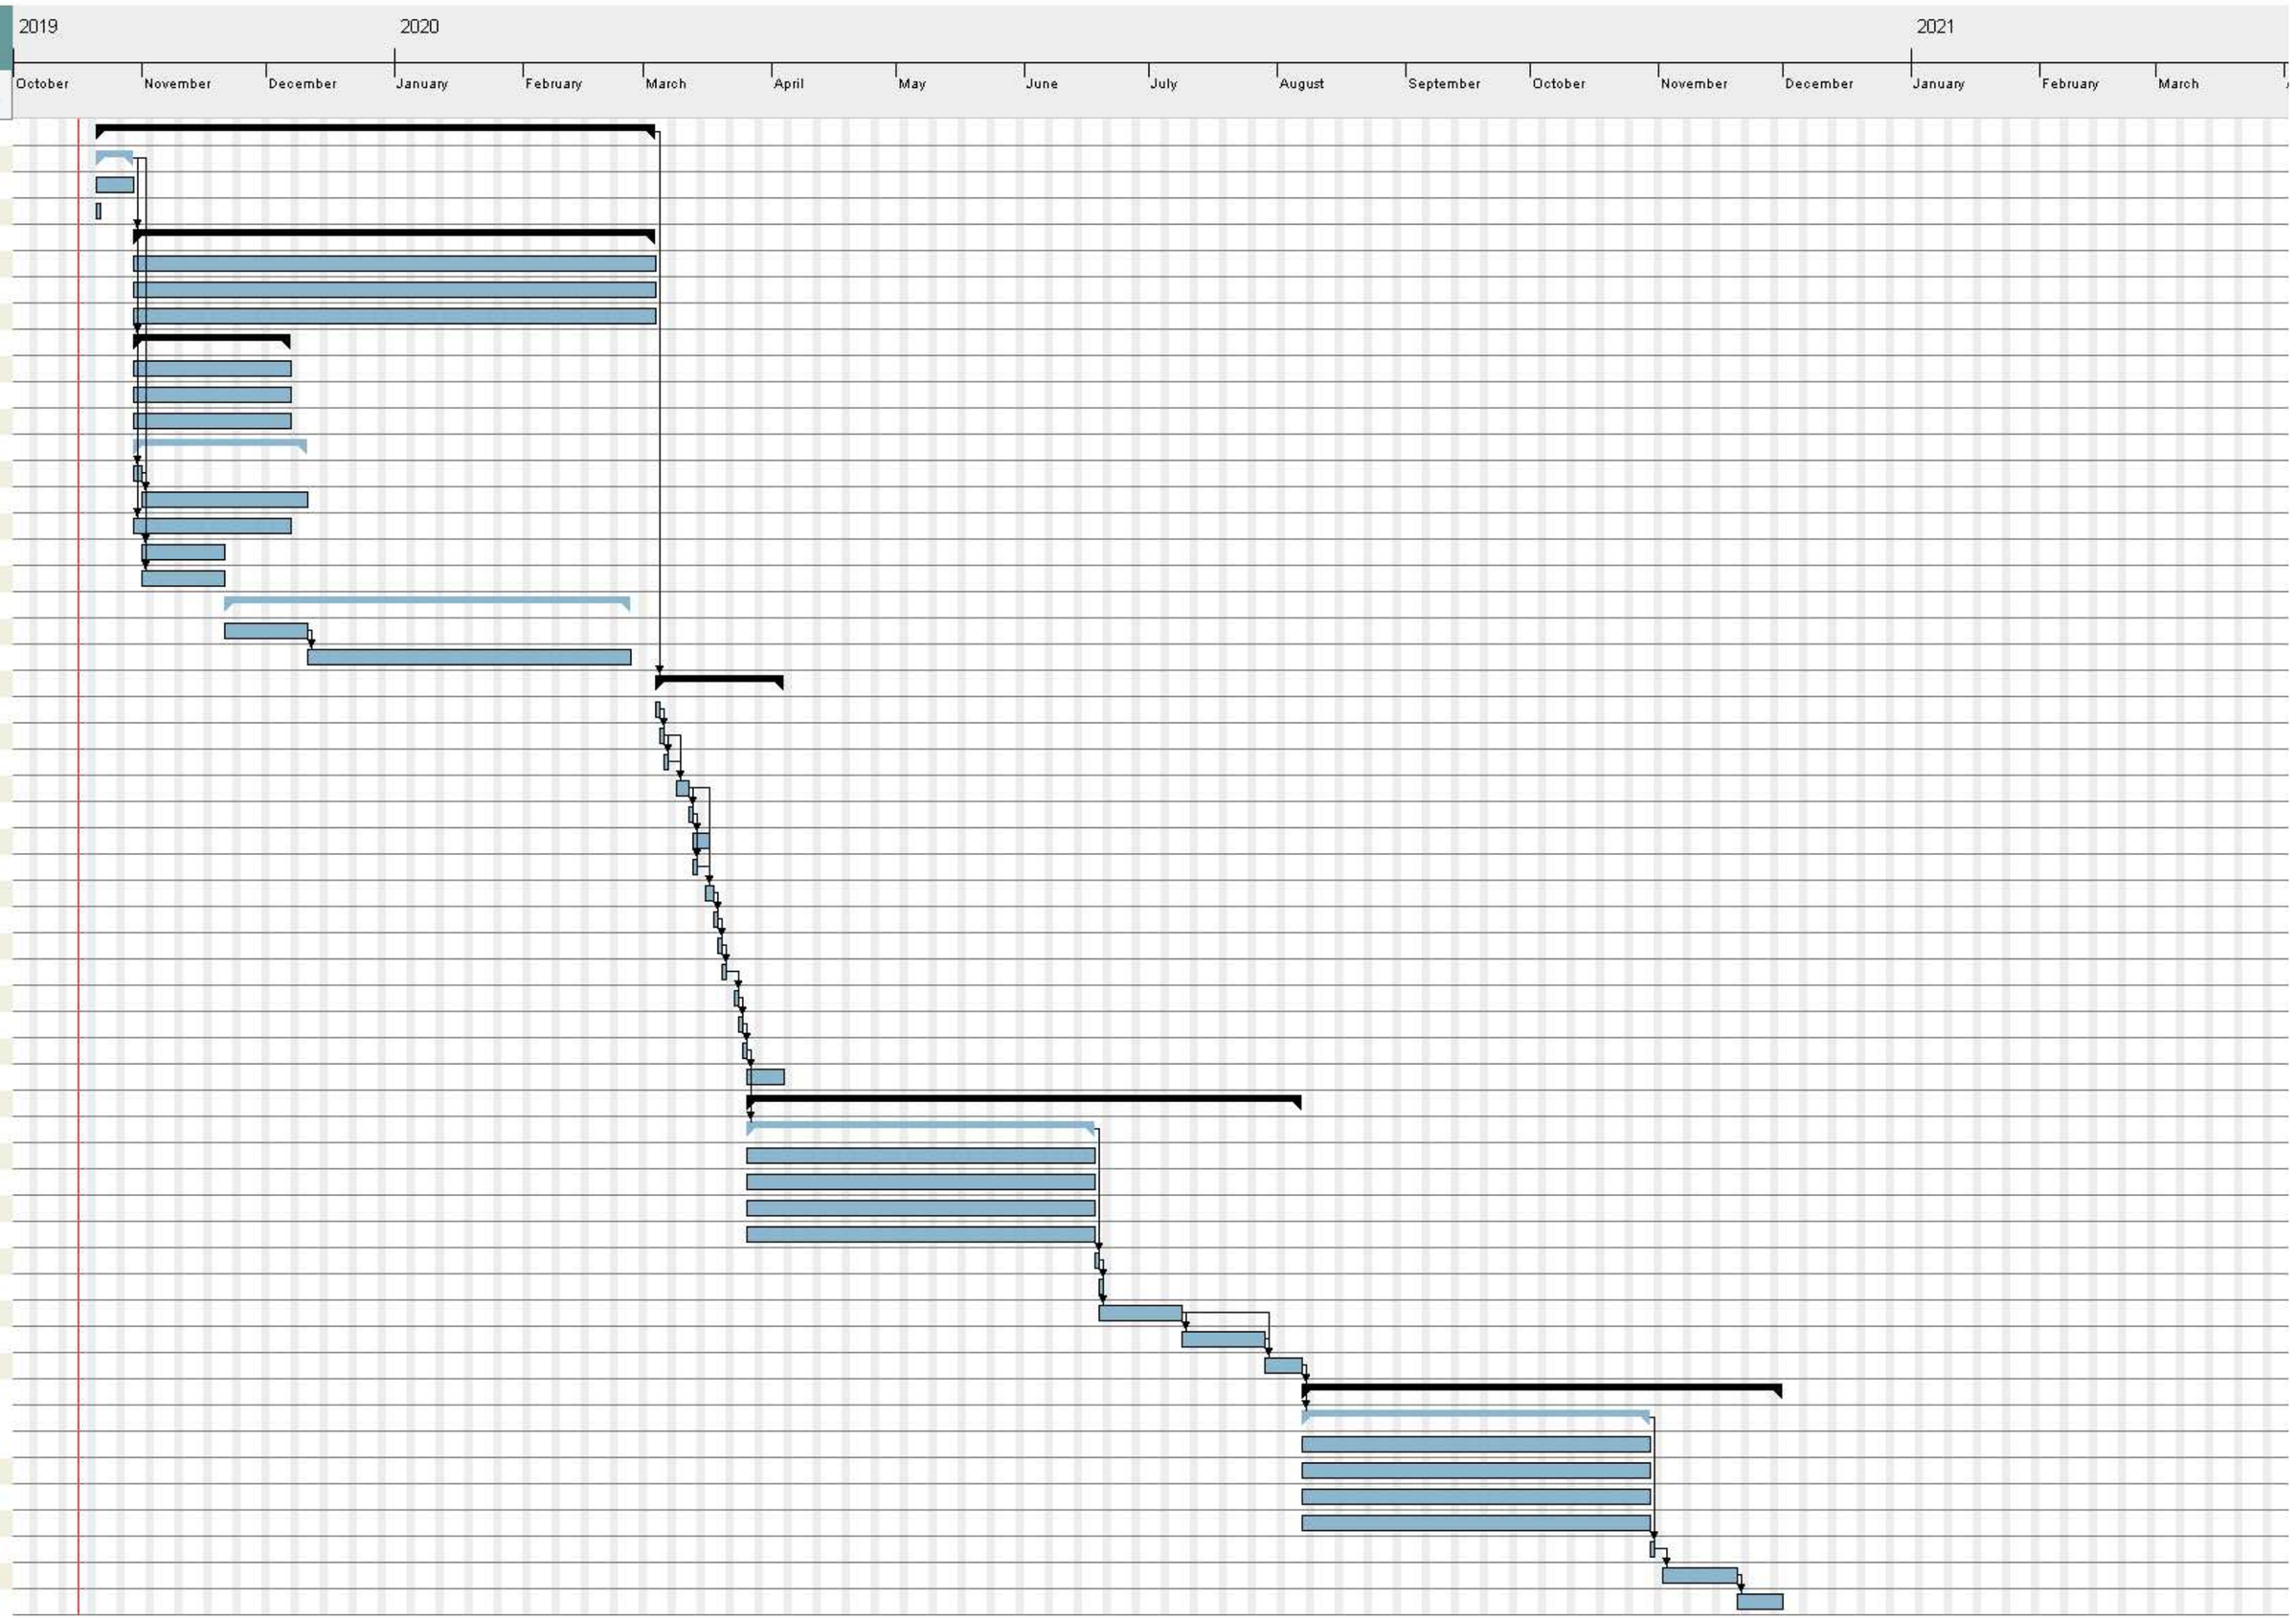

April May June
